
# Planning - Déroulement des sprints

La V1 est livrée en fin de semaine 9 (sprint 0 + 4 sprints de 2 semaines), la V2 en fin de semaine 13. Les dates calendaires seront fixées à la validation du cadrage par le directeur ; le planning est revu à chaque Sprint Review.

## Feuille de route

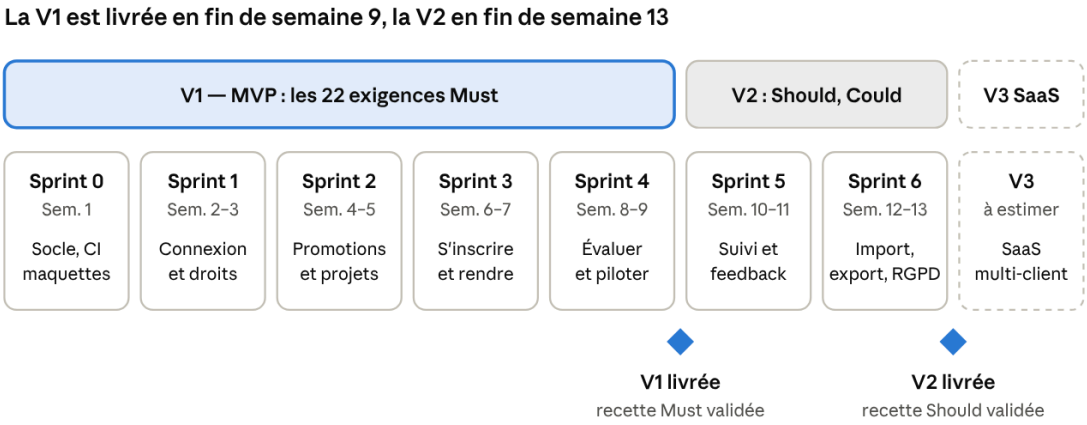


feuille de route · 7 sprints, 2 jalons de livraison

Chaque jalon est un critère de sortie : la version n'est livrée que si toutes ses exigences passent la recette.

## Détail des sprints

Les 22 exigences Must sont réparties sur les sprints 1 à 4 dans l'ordre des dépendances : on ne peut pas rendre un projet avant de pouvoir se connecter et créer une promotion.

| Sprint | Semaines | Sprint Goal | Exigences | Documentation produite dans le sprint |
|---|---|---|---|---|
| Sprint 0 | 1 | L'équipe peut développer, tester et déployer | Socle technique, CI, maquettes, environnement de recette | README, ADR-001 (choix de la stack), migrations initiales issues du MPD |

| Sprint | Semaines | Sprint Goal | Exigences | Documentation produite dans le sprint |
|---|---|---|---|---|
| Sprint 1 | 2–3 | Un utilisateur se connecte avec Google et obtient les droits de son rôle | EX-01, EX-02, EX-03, EX-04, EX-05, EX-25 | OpenAPI des routes d'authentification, REC-01 à REC-05, REC-25 ; refus REC-36, REC-37 |
| Sprint 2 | 4–5 | Un responsable met en place une promotion complète | EX-06, EX-09, EX-11, EX-12 | OpenAPI promotions, étudiants, UF, projets ; Storybook des formulaires et tableaux ; REC-06, REC-09, REC-11, REC-12 ; refus REC-31, REC-35 |
| Sprint 3 | 6–7 | Un étudiant s'inscrit à un projet et rend son travail | EX-13, EX-14, EX-16, EX-17, EX-18, EX-19 | OpenAPI groupes et rendus ; REC-13, REC-14, REC-16 à REC-19 ; refus REC-34 |
| Sprint 4 | 8–9 | L'équipe évalue et pilote les promotions | EX-21, EX-22, EX-24, EX-26, EX-27, EX-30 | OpenAPI évaluations et statistiques ; REC-21, REC-22, REC-24, REC-26, REC-27, REC-30 ; refus REC-32, REC-33 ; REC-38 à REC-40 ; CHANGELOG V1 |
| **Jalon V1** | fin sem. 9 | Recette complète des exigences Must, déclaration d'accessibilité | — | Critères de sortie de version (DoD) |

| Sprint | Semaines | Sprint Goal | Exigences | Documentation produite dans le sprint |
|---|---|---|---|---|
| Sprint 5 | 10–11 | Le suivi devient confortable | EX-07, EX-08, EX-15, EX-20, EX-23 | REC correspondants, CHANGELOG |
| Sprint 6 | 12–13 | Gain de temps et RGPD outillé | EX-10, EX-28, EX-29, export et purge RGPD | REC correspondants, CHANGELOG V2 |
| **Jalon V2** | fin sem. 13 | Recette des exigences Should et Could | — | — |
| V3 | à estimer | Plusieurs établissements sur la plateforme | Multi-organisation, isolation des données, personnalisation | ADR sur l'isolation des données |

Ce découpage est un prévisionnel : la vélocité réelle mesurée aux sprints 1 et 2 peut déplacer des exigences, et le PO réordonne le backlog à chaque Sprint Review.

## Déroulé type d'un sprint de 2 semaines

| Jour | Événement | Ce qui concerne la documentation et les tests |
|---|---|---|
| J1 | Sprint Planning (2 h) | Le temps de documentation et de tests est compté dans l'estimation de chaque story |
| J1 à J10 | Daily Scrum (15 min) | Une story ne passe en « En revue » qu'avec ses tests et sa documentation vivante |
| J2 à J9 | Développement, revue de code | Tests unitaires et d'intégration en CI ; OpenAPI et Storybook mis à jour dans le ticket |
| Mi-sprint | Affinage du backlog (1 h) | Le PO prépare les critères d'acceptation des stories suivantes |
| J9 | Recette sur l'environnement de recette | Le PO passe les scénarios REC-xx des stories terminées |

| Jour | Événement | Ce qui concerne la documentation et les tests |
|---|---|---|
| J10 | Sprint Review (1 h) avec le directeur | Démonstration ; CHANGELOG présenté ; exigences ajustées si besoin |
| J10 | Rétrospective (45 min) | Vérification que la documentation a suivi le code |

### Tableau Scrum

Le tableau vit dans GitHub Projects ; chaque carte est un ticket lié à une story (ETU-, PED-, TRV-) et à son exigence (EX-).

| Colonne | Une carte y entre quand… |
|---|---|
| Backlog du sprint | Elle est choisie au Sprint Planning |
| En cours | Un développeur la prend (2 cartes au plus par personne) |
| En revue | La pull request est ouverte, avec tests et documentation |
| En recette | La pull request est fusionnée et déployée en recette |
| Terminé | Tous les critères de la Definition of Done sont cochés |

Exemple : état du tableau au milieu du sprint 3.

| Backlog du sprint | En cours | En revue | En recette | Terminé |
|---|---|---|---|---|
| EX-18 Voir son groupe | EX-19 Rendre un projet | EX-16 Créer des groupes | EX-14 S'inscrire à un projet | EX-13 Catalogue des projets |
| | EX-17 Valider un groupe | | | |
